

万世園改築工事かわら版

第2号

工事についてお気づきの点がありましたら、下記にご連絡ください

【発行】
2021年(令和3年)11月
特別養護老人ホーム
万世園改築工事
連絡先(山形建設(株)本社)
(023) 644-5208
山形建設・太田建設
建設工事共同企業体

掘削工事、基礎工事が完了、鉄骨建て方工事はじめます

◆工事の経過

●地盤改良工事

(地盤を安定させる工事)

地盤改良工事は、8月末から9月初旬にかけて行いました。



8月下旬
地盤改良工事を行っています。地盤改良とは、基礎工事の前に、地盤を安定させるための工事です

●掘削工事(土を掘る工事)

掘削工事は、9月上旬行いました。



9月上旬
基礎工事のための、掘削工事を行っています

●基礎工事

9月中旬から、建物の基礎工事



9月中旬。基礎工事が始まりました。鉄筋や型枠(コンクリートを流し込むための木枠)を組み立てるための足場を組み立てています。

を行いました。基礎は、鉄筋コンクリート製です。

11月上旬には、基礎工事が完了しました。



10月上旬
引き続き、基礎工事を行っています



10月中旬
基礎工事を行っています。基礎ができあがってきました。一部、埋め戻しを行っています



11月上旬
基礎の工事が完了し、埋め戻し作業を行っています。写真は、土間(1Fの床)の工事などを行っているところです

◆今後の予定

11月下旬からは、鉄骨建て方工事をを行います。

工事は、近隣の皆様の安全を最優先に行っています。今後とも、皆様のご理解とご協力をいただきますよう、よろしくお願いいたします。




完成予想図

◆工事の担当者

私たちが工事に携わっています。よろしくお願いいたします。



機械設備工事
黒澤建設工業
高橋俊一

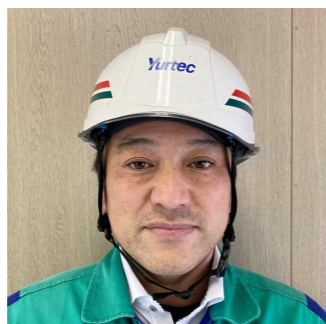

電気設備工事
ユアテック
菊地誠



土工事
山形建設
清原和彦

