砂沢治山工事ニュース

# 砂沢治山工事かわら版

工事についてお気づきの点がありましたら、下記にご連絡ください

## 治山ダム工事が無事に完了しました

### ◆この工事

この工事は、寒河江ダムの月山湖に注ぐ寒河江川支流「砂沢」に、治山ダムを造る工事です。

### ◆工事前の状態

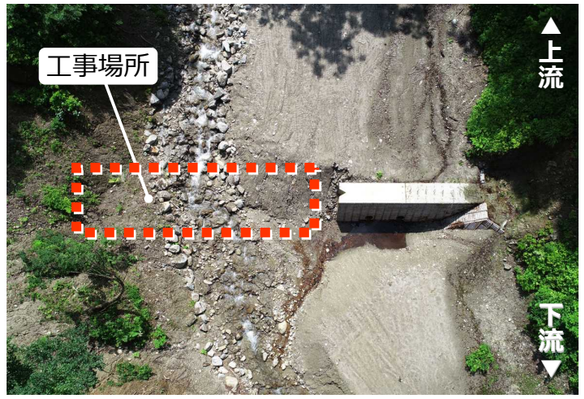


### ◆工事の経過

● 8 月

8月3日の大雨で砂沢が増水し、仮設道路などを含め冠水。型枠などは無事でした。水がひいてから復旧作業を行いました。

仮設道路を復旧しました。

● 9 月

型枠にコンクリートを流し込む工事を行いました。

● 10 月

大型カゴ枠を工事しています。

今回は、「木材残存型枠」という間伐材を利用した型枠を使い、コンクリートの構造体を造る工法です。完成後、型枠はそのまま残り、コンクリートが表面に現れません。間伐材の利用促進、自然との調和などの利点があります

### ◆工事完了

10 月末、工事が完了しました。

全景｜上段右の工事前の写真と同じアングルです

### ◆工事の担当者

私が工事を担当しました

ご協力ありがとうございます

現場代理人
**日下部晃**

**第2号（最終号）**

【発行】
2022（令和 4）年 11 月

砂沢治山工事
連絡先（山形建設（株）本社）
（023）644-5208

山形建設

砂沢治山工事ニュース

# 砂沢治山工事かわら版

工事についてお気づきの点がありましたら、下記にご連絡ください

## 寒河江川支流 砂沢に治山ダムを造る工事です

### ◆この工事

この工事は、寒河江ダムの月山湖に注ぐ寒河江川支流「砂沢」に、治山ダムを造る工事です。

### ◆工事の場所

### ◆工事前の状態

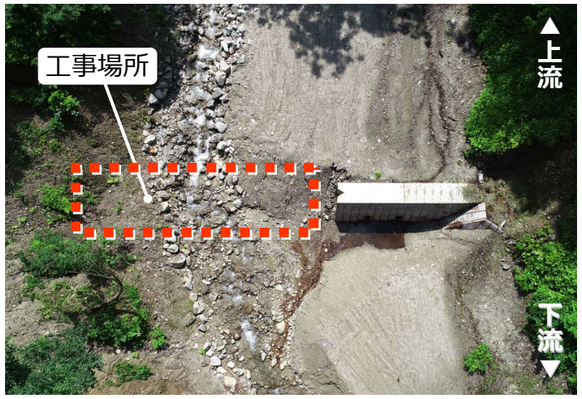


工事用道路の整備や、山腹（法面）保護の工事などを行い、治山ダムの右岸側（写真左側）を造ります。

### ◆工事の経過

●11月（2021（令和3）年）
簡易法枠工事の、法枠モルタル吹き付け工事が完了（上写真）
覆式ロックネット工事の、ネットを設置しています（下写真）

●6月（2022（令和4）年）
治山ダムの右岸側を造っています。コンクリートを流し込む型枠を組み立てました。

●7月
型枠にコンクリートを流し込んでいます（上写真）
完了しました（下写真）

### ◆工事の予定

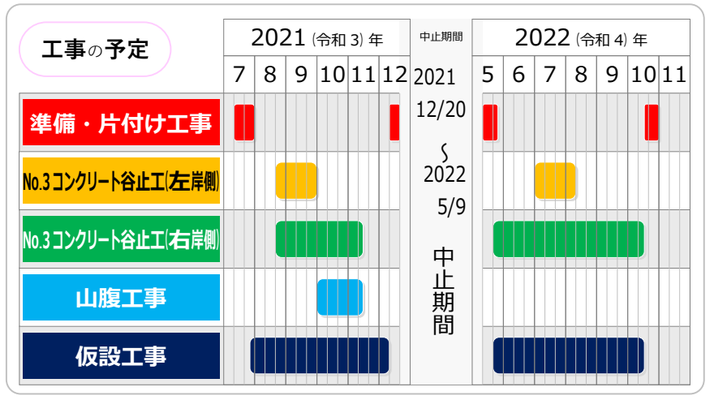


※ 2021（令和3）年12月20日から2022（令和4）年5月9日まで、積雪などのため工事を中止しました

### ◆工事の担当者

私が工事を担当しています
よろしくお願いいたします

現場代理人
**日下部晃**

### ◆工事の概要

工事名
砂沢治山工事

発注者
農林水産省 林野庁
東北森林管理局 山形森林管理署

工事場所
西川町大字月山沢字石御堂嶽
国有林104林班

工事期間
2021（令和3）年 7月9日から
2022（令和4）年 8月19日まで
※ 工事期間が延長になる予定です

施工
山形建設株式会社

工事概要
コンクリート谷止工……248、3㎥
大型カゴ枠工……117、0㎥
山腹工 簡易法枠工……546、4㎡
仮設工……1式
など


【発行】
2022（令和4）年8月
砂沢治山工事
連絡先（山形建設（株）本社）
(023) 644-5208


第1号

山形建設
